

不作为委托方已完成检测的正式凭证



中国认可
国际互认
检验
INSPECTION
CNAS IB0188



鲁 能源 20 02

报告编号:GX-B1499/26-P-26015

煤矿在用主排水泵 安全检测检验报告

委托单位: 陕西横山县殿市镇龙翔煤矿有限责任公司

受检单位: 陕西横山县殿市镇龙翔煤矿有限责任公司

设备名称: 离心式水泵

型号规格: D85-67×4

检验类别: 定期检验

检验日期: 2026年7月6日

中检集团公信安全科技有限公司



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定均未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路 1 号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测二站 3066776

检测三站 3066778

检测四站 3066779

检测五站 3066715

检测六站 3066691

检测七站 3066796

技术服务一室 3055855

技术服务三室 3066020

技术服务五室 3066021

技术服务七室 3055635

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

检测八站 3066635

检测九站 3066651

检测十站 3055017

检测十一站 3055317

检测十二站 3055013

检测十三站 3066707

材料检验站 3066765

技术服务二室 3055865

技术服务四室 3066786

技术服务六室 3055150

综合试验室 3055020

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用主排水泵安全检测检验报告

报告编号: GX-B1499/26-P-26015

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	陕西横山县殿市镇龙翔煤矿有限责任公司		
	地址	陕西省榆林市横山区殿市镇五龙山村		
水泵基本信息	名称	离心式水泵	设备编号	1#（工作泵）
	型号规格	D85-67×4	出厂日期	2011年5月
	制造单位	葫芦岛泵业制造有限公司	安装日期	2025年
	设备状态	使用中，表面轻微锈蚀，零部件齐全完整，泵体（管路、闸阀）密封严密，各种仪表齐全完整。		
检验地点		中央泵房	检验日期	2026年7月6日
检验类别		定期检验	下次检验日期	2027年雨季前
受检单位		陕西横山县殿市镇龙翔煤矿有限责任公司		
检验项目		标识牌、单泵启动时间、泵工况点效率、电机输入功率、吨水百米电耗、振动、噪声、水泵工业利用区、接地电阻		
检验依据		KA/T 1204-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 主排水系统》		
存在问题及建议		运行工况下，水泵效率小于额定效率的80%，吨水百米电耗高于0.5kW·h。		
检验结论		除泵工况点效率、吨水百米电耗不合格外，其余所检项目合格。		
检验组成员		董金华、黄繁		
备注		无。		

批准:

日期:

审核:

日期:

主检:

日期:

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用主排水泵安全检测检验报告

报告编号: GX-B1499/26-P-26015

共 6 页 第 3 页

检验项目

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	标识牌	标识牌应齐全并保持清晰。	标识牌齐全并保持清晰。	合格
2	单泵启动时间	单台水泵的启动时间应不大于 5 min。	118s	合格
3	泵工况点效率	运行工况下, 水泵的效率应不小于额定效率的80%。	运行工况下, 水泵的效率为额定效率的29.3%。	不合格
4	电机输入功率	运行工况下, 配用电机输入功率应不超过其额定功率。(≤110kW)	85.3kW	合格
5	吨水百米电耗	吨水百米电耗应低于0.5kW·h。	1.904kW·h	不合格
6	振动	水泵运行时, 振动级别应不低于 GB/T 29531中C级的规定。	B级	合格
7	噪声	作业人员每周工作5d, 每天工作8h, 稳态噪声限值为85dB(A), 非稳态噪声等效声级的限值为85dB(A); 每周工作 5d, 每天工作不等于8h, 需计8h等效声级, 限值为85dB(A); 每周工作日不是5d, 需计算40h等效声级, 限值为85dB(A)。	作业人员每周工作5d, 每天接触噪声时长2~5h。	合格
			噪声声级 83.3 dB(A)	
8	水泵工业利用区	性能曲线上的水泵工业利用区应能满足矿井排水需要。	能满足矿井排水需要。	合格
9	接地电阻	电控设备、电动机外壳应可靠接地, 接地电阻应不大于2Ω。	可靠接地, 接地电阻0.86Ω。	合格

煤矿在用主排水泵安全检测检验报告

报告编号: GX-B1499/26-P-26015

共 6 页 第 4 页

主排水泵检验数据及结果

水泵调节工况点检测数据

序号	检验项目	符号	单位	数据来源	测 算 结 果				
					1	2	3	4	5
1	流 量	Q	m^3/h	实测	22.3	36.7	56.9	79.2	99.2
2	进口压力	P_z	MPa	实测	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028
3	出口压力	P_y	MPa	实测	0.66	0.64	0.61	0.57	0.54
4	表 位 差	Z	m	实测	0.40				
5	吸水管内径	d_z	mm	计算	200				
6	排水管内径	d_p	mm	计算	200				
7	扬 程	H	m	计算	69.2	67.2	64.2	60.2	57.2
8	吸水高度	H_x	m	实测	2.2				
9	排水高度	H_z	m	查资料	42.0				
10	实际排高	H_a	m	计算	44.2				
11	输入功率	P_{gr}	kW	实测	53.2	56.7	63.8	72.2	85.3
12	电机效率	η_d	%	查资料	94.0				
13	泵轴功率	P_a	kW	计算	50.0	53.3	60.0	67.9	80.2
14	水泵效率	η	%	计算	8.6	12.9	16.9	19.5	19.7
15	管路效率	η_g	%	计算	63.9	65.8	68.9	73.5	77.3
16	系统效率	η_x	%	计算	5.1	8.0	11.0	13.5	14.3
17	吨水百米电耗	$W_{t \cdot 100}$	$kW \cdot h$	计算	5.282	3.421	2.482	2.018	1.904
18	运行工况点振动	/	mm/s	实测		测点1	测点2	测点3	测点4
					X	2.9	2.2	2.1	1.6
					Y	3.1	2.1	1.8	2.3
					Z	1.8	1.3	1.7	1.9
					振动烈度级:				4.5 mm/s
19	噪 声	/	dB(A)	实测	83.3				
20	泵的启动时间	/	s	实测	118				

煤矿在用主排水泵安全检测检验报告

报告编号: GX-B1499/26-P-26015

共 6 页 第 6 页


水泵主要参数		
水泵编号	1# (工作泵)	
水泵铭牌参数	型号	D85-67×4
	额定流量 (m³/h)	85
	额定扬程 (m)	268
	转速 (r/min)	2950
	效率 (%)	67
	生产厂家	葫芦岛泵业制造有限公司
	出厂编号	0505015B
	出厂日期	2011年5月
	轴功率 (kW)	92.2
电动机铭牌参数	型号	YBK2-315S-2
	额定功率 (kW)	110
	定子电压 (V)	660
	定子电流 (A)	113
	效率 (%)	94.0
	转速 (r/min)	2980
	生产厂家	沈阳黎明电机制造有限公司
	出厂日期	2011年4月
其它参数	吸水管规格 (mm)	210×5
	排水管规格 (mm)	210×5
	排水高度 (m)	42.0
	吸水高度 (m)	2.2
	正常涌水量 (m³/h)	40.0

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用主排水泵安全检测检验报告

报告编号: GX-J1499/26-P-26015

附 页

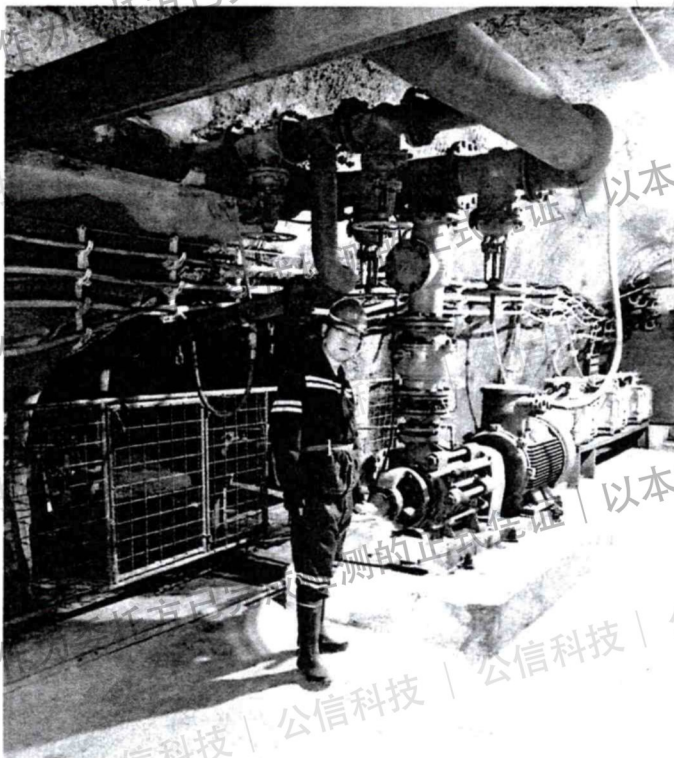

陕西骊山县城南镇龙翔煤矿有限责任公司
2023 07 06





陕西横山县殿市镇龙翔煤矿有限责任公司

2026 07 06

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准
