



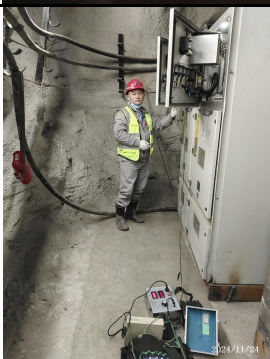
序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
57	GX-B1451/20-2-24496~24505	2024. 12. 7	本次共检高压开关柜10台，10台高压开关柜所检项目合格。	
58	GX-B1451/20-2-24506~24514	2024. 12. 7	本次共检高压开关柜9台，9台高压开关柜所检项目合格。	
59	GX-B1451/20-2-24515~24521	2024. 12. 7	本次共检高压开关柜7台，7台高压开关柜所检项目合格。	



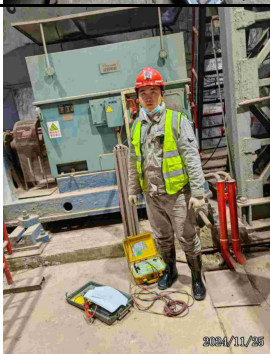
60	GX-B1451/20-2-24522~24523	2024. 12. 7	本次共检高压开关柜2台，2台高压开关柜所检项目合格。	 <p>2024/11/20</p>
61	GX-B1451/20-2-24524~24527	2024. 12. 7	本次共检高压开关柜4台，4台高压开关柜所检项目合格。	 <p>2024/11/20</p>
62	GX-B1451/20-2-24542~24557	2024. 12. 7	本次共检高压开关柜16台，16台高压开关柜所检项目合格。	 <p>2024/11/20</p>

63	GX-B1451/20-2-24622~24649	2024. 12. 7	本次共检高压开关柜28台，28台高压开关柜所检项目合格。	
64	GX-B1451/20-2-24653~24659	2024. 12. 7	本次共检高压开关柜7台，7台高压开关柜所检项目合格。	
65	GX-B1451/20-2-24660~24663	2024. 12. 7	本次共检高压开关柜4台，4台高压开关柜所检项目合格。	

66	GX-B1451/20-2-24668~24671	2024. 12. 7	本次共检高压开关柜4台，4台高压开关柜所检项目合格。	 <p>2024/11/28</p>
67	GX-B1451/20-2-24673~24676	2024. 12. 7	本次共检高压开关柜4台，4台高压开关柜所检项目合格。	 <p>2024/11/29</p>
68	GX-B1451/20-2-24683~24690	2024. 12. 7	本次共检高压开关柜8台，8台高压开关柜所检项目合格。	 <p>2024/11/29</p>

69	GX-B1451/20-2-24713~24714	2024. 12. 7	本次共检高压开关柜2台，2台高压开关柜所检项目合格。	
70	GX-B1451/20-2-24591	2024. 12. 11	所检项目合格。	
71	GX-B1451/20-2-24594~24595	2024. 12. 11	所检项目合格。	

72	GX-B1451/20-2-24596~24597	2024. 12. 11	所检项目合格。	
73	GX-B1451/20-2-24650~24652	2024. 12. 11	所检项目合格。	
74	GX-B1451/20-2-24715~24720	2024. 12. 11	所检项目合格。	

75	GX-B1451/20-2-24721~24727	2024. 12. 11	所检项目合格。	
76	GX-B1451/20-2-24728~24731	2024. 12. 11	所检项目合格。	
77	GX-B1324/21-2-24032	2024. 12. 11	所检项目合格。	

78	GX-B1328/20-2-24116	2024/12/11	本次共检验电器27支，27支所检项目合格。	
79	GX-B1328/20-2-24117	2024/12/11	本次共检携带式接地和接地短路装置23组，23组所检项目合格。	
80	GX-B1328/20-2-24118	2024/12/11	本次共检绝缘杆14组，14组所检项目合格。	




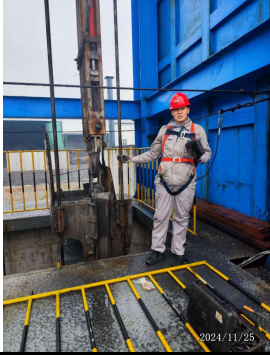

81	GX-B1328/20-2-24119	2024/12/11	本次共检绝缘胶垫169块，169块所检项目合格。	 2024/11/26
82	GX-B1328/20-2-24120	2024/12/11	本次共检绝缘胶垫88块，88块所检项目合格。	 2024/11/26
83	GX-B1598/24-2-24303	2024/12/20	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.47%，小于5%为正常。	 2024/11/25

84	GX-B1598/24-2-24304	2024/12/20	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.56%，小于5%为正常。	 2024/11/25
85	GX-B1598/24-2-24305	2024/12/20	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.63%，小于5%为正常。	 2024/11/25
86	GX-B1598/24-2-24306	2024/12/20	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.50%，小于5%为正常。	 2024/11/25

87	GX-B1598/24-2-24307	2024/12/20	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.35%，小于5%为正常。	
88	GX-B1598/24-2-24308	2024/12/20	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.28%，小于5%为正常。	
89	GX-B1598/24-2-24315	2024/12/15	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.11%，小于5%为正常。	

90	GX-B1598/24-2-24316	2024/12/15	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.32%，小于5%为正常。	
91	GX-B1598/24-2-24317	2024/12/15	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.09%，小于5%为正常。	
92	GX-B1598/24-2-24318	2024/12/15	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.43%，小于5%为正常。	

93	GX-B1598/24-2-24319	2024/12/15	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.67%，小于5%为正常。	
94	GX-B1598/24-2-24320	2024/12/15	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.80%，小于5%为正常。	
95	GX-B1310/21-2-24404	2024/12/15	符合标准要求。	

96	GX-B1310/21-2-24405	2024/12/15	符合标准要求。	
97	GX-B1310/21-2-24406	2024/12/15	符合标准要求。	
98	GX-B1427/21-2-24406	2024/12/15	符合标准要求。	

99	GX-B1598/24-2-24309	2024/12/15	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.36%，小于5%为正常。	
100	GX-B1598/24-2-24310	2024/12/15	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.07%，小于5%为正常。	
101	GX-B1598/24-2-24311	2024/12/15	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.97%，小于5%为正常。	

102	GX-B1598/24-2-24312	2024/12/15	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.20%，小于5%为正常。	
103	GX-B1598/24-2-24313	2024/12/15	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.88%，小于5%为正常。	
104	GX-B1598/24-2-24314	2024/12/15	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.76%，小于5%为正常。	
