
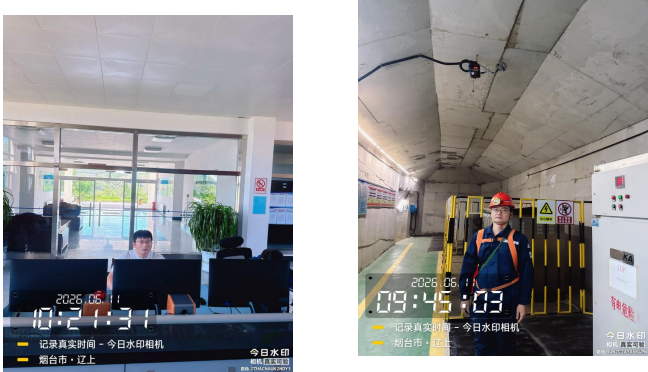
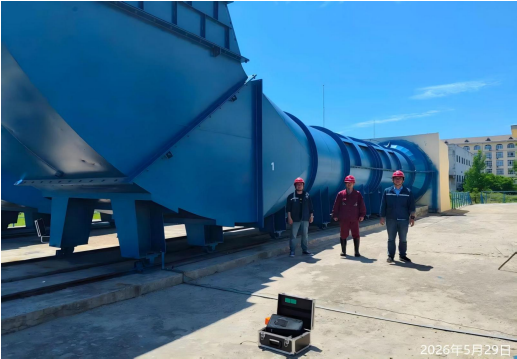


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
41	GX-B1343/26-9-26032	2026.6.17	1. 矿井实测风量： 254.84m ³ /s， 2. 机站风压：南回风井主通风机1920Pa，中央回风井主通风机2150Pa； 3. 矿井通风阻力：南回风井通风系统1860.2Pa，中央回风井通风系统2032.4Pa。	
42	GX-B1347/26-9-26032	2026.6.17	1. 矿井总进风量： 241.34m ³ /s； 2. 总回风量：254.84m ³ /s； 3. 实测风量：254.84m ³ /s； 4. 风量（风速）合格率： 92.3%，合格； 5. 风源风质合格率：100%，合格； 6. 作业场所空气质量合格率： 76.9%，合格； 7. 有效风量率：63.6%，合格； 8. 风机效率（静压/全压）： 静压效率75.8%，全压效率71.8%，合格； 9. 风量供需比：1.43，合格； 10. 综合指标：82.9%，合格。	

43	GX-B1343/26-9-26033	2026.6.17	1. 矿井实测风量： 316.36m³/s， 2. 机站风压：中央回风井主通风机2060Pa，新北回风井主通风机2170Pa； 3. 矿井通风阻力：中央回风井通风系统1930.6Pa，新北回风井通风系统2122.9Pa。	 日期: 2026年6月17日
44	GX-B1347/26-9-26033	2026.6.17	1. 矿井总进风量：301.55m³/s； 2. 总回风量：316.36m³/s； 3. 实测风量：316.36m³/s； 4. 风量（风速）合格率：85.7%，合格； 5. 风源风质合格率：100%，合格； 6. 作业场所空气质量合格率：78.6%，合格； 7. 有效风量率：61.8%，合格； 8. 风机效率（静压/全压）：静压效率77.85%，全压效率83.65%，合格； 9. 风量供需比：1.00，不合格； 10. 综合指标：80.4%，合格。	 日期: 2026年6月17日

45	GX-B1425/26-9-26014	2026. 6. 22	1. 机站正常通风风量: +365m回风平硐主通风机45.40 m³/s; 2. 机站反风风量: +365m回风平硐主通风机31.40 m³/s; 3. 机站反风率: +365m回风平硐主通风机69.16%; 4. 矿井风流反向用时: 4分30秒。	 2026.05.25
46	GX-B1425/26-9-26015	2026. 6. 22	1. 机站正常通风风量: +130m中段主通风机67.28 m³/s; 2. 机站反风风量: +130m中段主通风机52.86 m³/s; 3. 机站反风率: +130m中段主通风机78.57%; 4. 矿井风流反向用时: 3分40秒。	 2026.05.26

47	GX-B1425/26-9-26016	2026. 6. 22	1. 机站正常通风风量：南区+160m中段通风机22.02 m³/s，北区+220m中段通风机31.85 m³/s； 2. 机站反风量：南区+160m中段通风机17.53 m³/s，北区+220m中段通风机28.16 m³/s； 3. 机站反风率：南区+160m中段通风机79.61%，北区+220m中段通风机88.41%； 4. 矿井风流反向用时：南区7分20秒，北区4分10秒。	
48	GX-B1371/21-9-26030	2026年6月22日	存在问题： 1、监测监控设备未按照说明书要求进行定期调校。 2、系统发出报警信息，处置结果未全部记录备案。 3、传感器调校记录表内容填写错误。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 

49	GX-B1371/21-9-26031	2026年6月22日	存在问题： 1、监测监控设备未按照说明书要求进行定期调校。 2、系统发出报警信息，处置结果未全部记录备案。 3、传感器调校记录表内容填写错误。 除上述问题外，其余所检项目合格。	
50	GX-B1340/26-9-26020	2026年6月23日	合格。	

51	GX-B1340/26-9-26021	2026年6月23日	合格。	
52	GX-B1340/26-9-26023	2026. 6. 23	合格。	

53	GX-B1340/26-9-26024	2026. 6. 23	合格。	 2026年6月4日
54	GX-B1341/24-9-26085	2026. 6. 23	综合判定：合格。	 2026.06.09

55	GX-B1343/26-9-26036	2026. 6. 23	1. 矿井实测风量： 36.17 m³/s； 2. 主通风机负压：北 风井主通风机1260 Pa； 3. 矿井通风阻力：北 风井通风系统1196.4 Pa。	
56	GX-B1347/26-9-26036	2026. 6. 24	1. 矿井总进风量：34.80 m³/s； 2. 总回风量：36.17 m³/s； 3. 实测风量：36.17 m³/s； 4. 风量（风速）合格率： 100%，合格； 5. 风源风质合格率：100%，合 格； 6. 作业场所空气质量合格率： 100%，合格； 7. 有效风量率：64.0%，合 格； 8. 风机效率：全压效率 78.2%，静压效率61.9%，合 格； 9. 风量供需比：1.21，合格； 10. 综合指标：85.7%，合格。	

57	GX-B1341/24-9-26083	2026. 6. 23	综合判定：合格。	 A photograph showing two workers in blue uniforms and red helmets standing in a tunnel. The date 2026.05.07 is visible in the top right corner of the image.
58	GX-B1341/24-9-26084	2026. 6. 23	综合判定：合格。	 A photograph showing two workers in blue and grey uniforms and red helmets standing in a tunnel. The date 2026.05.07 is visible in the bottom right corner of the image.

59	GX-B1343/26-9-26035	2026. 6. 23	1. 矿井实测风量： 67.76 m³/s； 2. 主通风机负压：+20m 中段主通风机1044 Pa，原土堆竖井主通 风机1160Pa； 3. 矿井通风阻力：南 风井通风系统1021.5 Pa，原土堆竖井通风 系统1083.7 Pa。	
60	GX-B1347/26-9-26035	2026. 6. 23	1. 矿井总进风量：62.48 m³/s； 2. 总回风量：67.76 m³/s； 3. 实测风量：68.56 m³/s； 4. 风量（风速）合格率： 100%，合格； 5. 风源风质合格率：100%，合 格； 6. 作业场所空气质量合格率： 100%，合格； 7. 有效风量率：66.5%，合 格； 8. 风机效率：全压效率 75.9%，静压效率61.5%，合 格； 9. 风量供需比：1.43，合格； 10. 综合指标：86.2%，合格。	
